

## KORÁNYI PROJEKT

### Tájékoztató a beruházás előrehaladásáról

2014. december 13.


Tisztelt Munkatársak!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Korányi projekt kivitelezésének elmúlt időszakban elért előrehaladásáról.

### ÚJ KÖZPONTI BETEGELLÁTÓ ÉPÜLET

Az új központi betegellátó épület homlokzatain befejeződtek a burkolási munkák. Az épületen a belső szakipari munkák kivitelezése felgyorsult, így egyes helyeken már a befejező munkák (burkolás, festés, stb.) is megkezdődtek. A leginkább előrehaladott állapotban a 2-3. emeleti kórtermi szintek vannak, ahol a festési, hidegburkolási munkák mellett a beépített bútorok telepítése és a melegburkolatok készítése is megkezdődött. A 4. emeleti intenzív kórtermek kialakítása is befejezés előtt áll. A kórtermi szinteken kívül a központi labor, központi sterilizáló és a sürgősségi betegellátó területeken is folynak a munkák.

A tetőszinten a műtőket ellátó gépészeti helyiségek kialakítása befejeződött, a dolgozók öltözői blokkjai előrehaladott állapotot értek el. A pincszinti technikai helyiségcsoportok is magas készültséget értek el. Az épület tetején található helikopter leszállóhely kialakítása látványosan folytatódott.

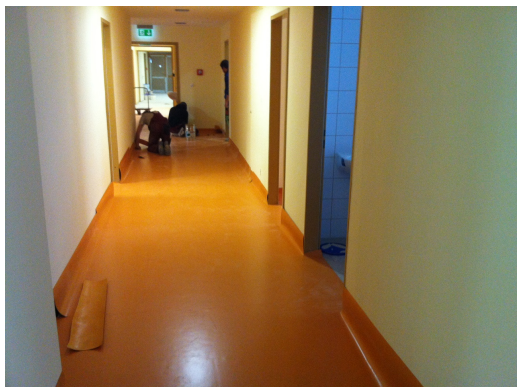

Előrelépés történt az orvosi gáz, a gyengeáramú rendszerek, az informatikai hálózat és a tűzvédelmi rendszer kiépítése terén. Felszerelésre kerültek többek között a hőleadó radiátorok, így a munkák folytatásához szükséges megfelelő hőmérséklet biztosított a távhő szolgáltatás elindulásával. Az épületgépészeti szerelvények, mosdók, stb. elhelyezése ütemesen halad. Az épület liftjeinek beszerelési munkái magas készültségi szintet értek el.

A kivitelezéssel párhuzamosan az orvostechnikai eszközök telepítése is folytatódott, bár az eszközök döntő részének szállítása a kivitelezés későbbi szakaszában, 2015. I-II. negyedévében várható. Az orvos szakma és a modern kor elvárásainak megfelelő színvonalú berendezéseket, eszközöket a kivitelezés előrehaladásának függvényében építik be. Az ágymosó, matracfertőtlenítő gépek, a központi sterilizáló berendezések és egyéb technikai felszerelések leszállításra kerültek. Az épületben található hűtőkamrák telepítése befejeződött.

## A II. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA ÉS A RADIOLÓGIAI KLINIKA ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika meglévő épületében az új előcsarnok kialakítása hamarosan befejeződik, és az utcai kerítés átalakításával együttesen eléri végleges formáját. A liftek és mozgólépcsők telepítése befejeződött.

A Radiológiai Klinika új előlépcsőt kapott. A régi és új épület összenyitása minden szinten elkészült.

A klinikai épület homlokzati felújítása és a belső udvarok kertépítési munkái, növénybeültetései befejeződtek.

Az épületrészben hamarosan befejeződnek a belső munkálatok. A központi betegirányító, az officina és az ambulancia helyiségei bútorozással együtt készen állnak.



A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika újszülött és újszülött intenzív osztályán a helyiségek melegburkolási és festési munkái, valamint a beépített bútorok telepítése befejezés előtt áll.

Az épületgépészeti és elektromos szerelvényezések felszerelése befejeződött.

Az épületben kialakított helyiségek műszaki átadás-átvételének folyamata megkezdődött, így lehetőség nyílik a használatbavételi, működési engedély hatósági folyamatának elindítására.

## ÚJ ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT

Az új központi épületet a meglévő klinikai épületekkel összekötő folyosók munkái is látványosan készülnek.

Az útépítés miatt a Belgyógyászati Klinika oldalán korábban hiányzó hídszakasz beemelése után a szerkezetek építése és a befejező munkák is hamarosan lezárulhatnak.

A klinikai épületekhez kapcsolódó tornyok homlokzatképzése elkészült, a liftek beszerelésre kerültek.



Az építési területen a Külső Klinikai Tömb belső úthálózatának és - ezzel párhuzamosan - közműhálózatának kiépítése is ütemezetten folyik. A járda és kertépítési munkák megkezdődtek. A több ütemre bontott építési munkák figyelembe veszik a különböző klinikai épületekben történő betegellátás folyamatos biztosításának igényeit.

A fő gerincút építése a Korányi Sándor utca felől a központi betegellátó épületig elkészült, hamarosan összekötésre kerül az eddig megépült további szakaszokkal. A Klinikai Tömb külső bejáratainak kialakítása, kerítések átépítései elkészültek.

A KKT elektromos fővezeték hálózatának felújítása hamarosan befejezhető, amelynek köszönhetően a klinikai épületek elektromos energiaellátása üzembiztosabbá válik.

A mindenkor aktuális helyzetről további felvilágosítást kaphatnak az [info@koranyiprojekt.hu](mailto:info@koranyiprojekt.hu) email címen.



Ezúton kívánunk Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!

Semmelweis Egyetem, Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet
